




Departamento Nacional de Planeación
www.dnp.gov.co



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Introducción

¿QUÉ ES EL SPI Y PARA QUÉ SIRVE?

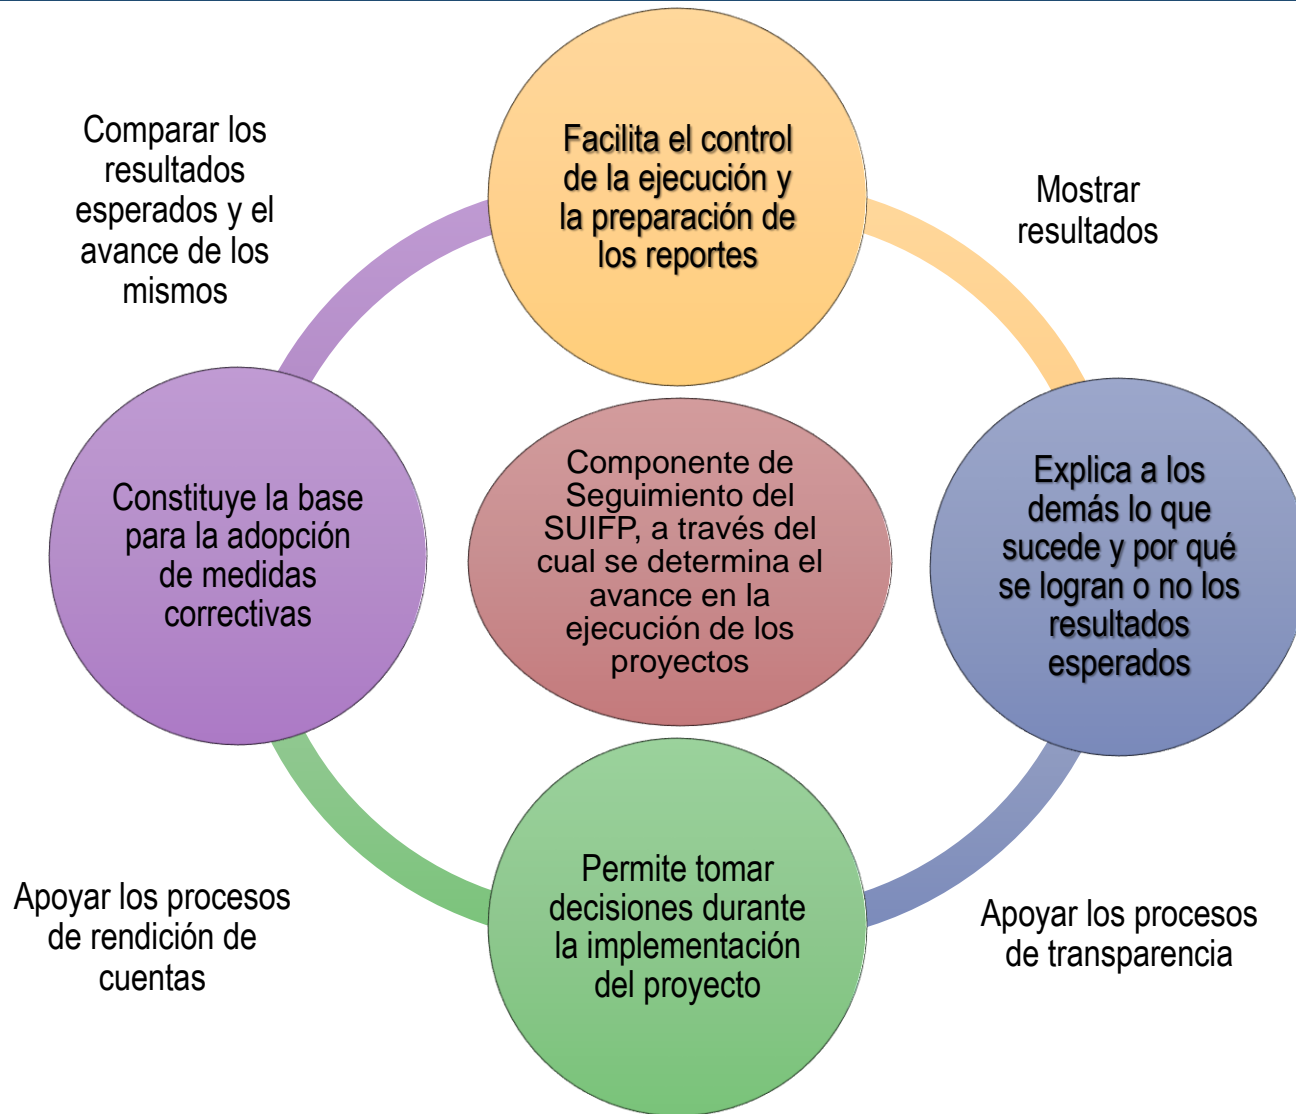




Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Relación SUIFP - SPI

METODOLOGÍA PARA HACER USO DEL SPI

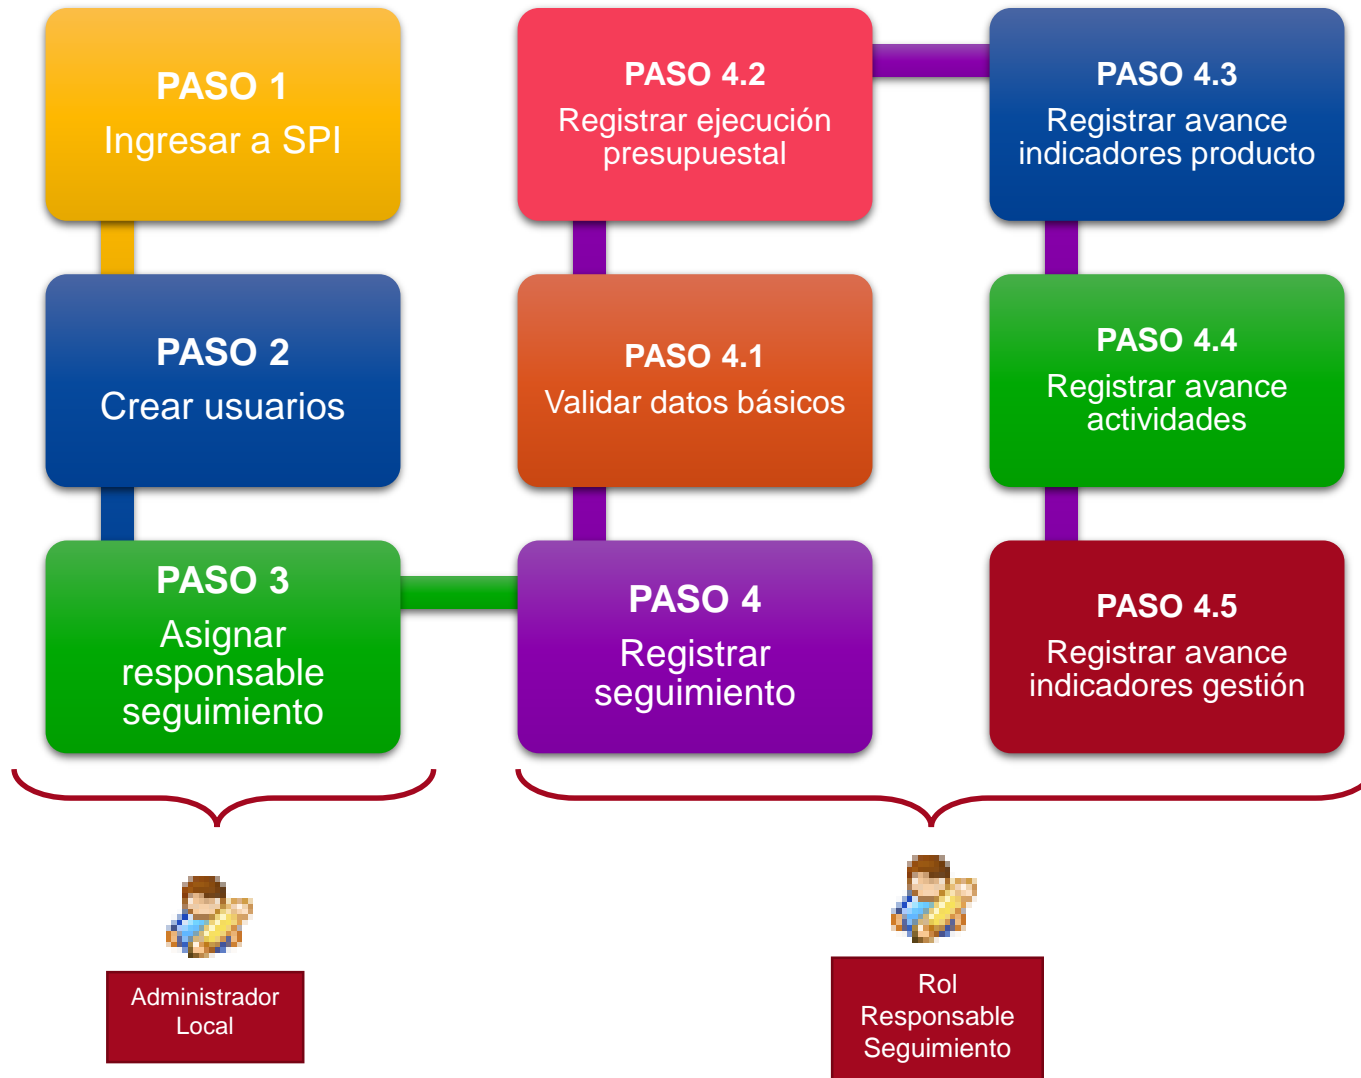



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 1. Ingreso

<https://spi.dnp.gov.co/>

SPI

- Si va acceder como ciudadano, utilice el enlace "Usuario Anónimo".
- Si usted es usuario del SPI, y ya es un usuario de la MGA Web o del SUIFP, favor ingresar con el tipo y No. de documento y clave que utiliza en éstos sistemas.
- Si usted es usuario del SPI y es funcionario o contratista del DNP, utilice el enlace "Usuarios DNP".
- Si usted no hace parte de los anteriores grupos de usuarios, a la cuenta de correo que tiene registrada en el SPI, se le enviará un enlace para que registre su nueva clave de acceso.



* Campos requeridos



Iniciar sesión

Tipo de documento de identificación *

Seleccione

Número de documento de identificación *

Número de documento de identificación

Contraseña *

Ingresar

[Usuarios DNP](#)

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[Usuario anónimo](#)

Seleccione el tipo de documento con el que se registró

Digite número de identificación con el que se registró

Digite la contraseña del registro

Pulse el botón para ingresar



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 2. Creación usuarios

Crear Usuarios



Administrador
Local

Creas los usuarios del SPI para la entidad territorial y los **notifica**.



SPI *dnp.gov.co*
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Seguimiento Territorio

Seguridad Territorio

2. Grabe la información

3. Notifique al usuario su creación, para que este asigne su contraseña

Entidad Usuario:
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Inicio | Seguridad Territorio | Usuarios | Crear

Crear Usuarios

Tipo documento

Primer Nombre

Primer Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Departamento:

Entidad Territorial

Entidad

Perfil

Estado

PASO:

Formulario de creación de usuarios con campos:

- Tipo documento: Cedula de Ciudadanía
- Número documento: []
- Segundo Nombre: []
- Segundo Apellido: []
- Dirección: []
- Municipio: SIN MUNICIPIO
- Departamento: Antioquia
- Entidad Territorial: NARIÑO
- Entidad: NARIÑO - NARIÑO-0352
- Perfil: Responsable Seguimiento
- Habilitado: []

1. Digite la información básica del usuario



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 3. Asignación responsable de seguimiento

Asignar responsable de seguimiento

Asigna el Responsable del proyecto (gerente o supervisor), buscando por código BPIN

Seguimiento Territorio | Seguridad Territorio

martes, 15 de mayo de 2018

Entidad Usuario: MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Inicio | Seguridad Territorio | Asignar Responsables | Asignar Responsables

Asignar Responsables a Proyectos

Código BPIN: Usuario:

Nombre del Proyecto:

Proyectos - Entidad: NARIÑO

Usuarios - Entidad: NARIÑO

Perfil a Asignar: Responsable Seguimiento

Seleccionar Todos	Entidad	Código BPIN	Proyecto	Responsable	Nombre Usuario	Usuario Entidad
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520001	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y COBERTURA DIGITAL TIC DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520002	FORTALECIMIENTO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL PARA MEJORAR EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520004	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520006	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE NARIÑO CISNA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520007	FORTALECIMIENTO DE LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520008	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE GANA(GOBIERNO ABIERTO EN LÍNEA) EN NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520010	IMPLEMENTACIÓN DESARROLLAR LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520013	ESTUDIOS TECNICOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO SOBRE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y SU DIVULGACION NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520019	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA DE LOS ENTES TERRITORIALES NARIÑO	(No Asignado)		
<input type="checkbox"/>	(NARIÑO) - NARIÑO	2017003520020	FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	(No Asignado)		

Administrador local

Asigne responsable por proyecto, buscando BPIN

Escoja el responsable asignar de la lista de usuarios creados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 4. Realización del seguimiento

Registrar seguimiento



Rol
Responsable
Seguimiento

Registra el seguimiento del proyecto y realiza la **focalización de recursos**



SPI *dnp.gov.co*
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Seguimiento Territorio

Entidad Usuario:
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Icono para ejecutar la búsqueda

- Registrar Seguimiento
- Registrar Seguimiento**
- Consultar Seguimiento
- Diagnóstico

B
U
S
C
A
D
O
R

[Inicio](#) | [Seguimiento Territorio](#) | [Registrar Seguimiento](#) | [Registrar Seguimiento](#)

Registro



Código BPIN:

Nombre del Proyecto:

Entidad Territorial: Entidad:

Responsable:

Vigencia Desde: Período: Diciembre Periodicidad: MENSUAL

Vigencia Hasta: Período: Mayo Periodicidad: MENSUAL

Aquí se ven los proyectos de los cuales es responsable de seguimiento el usuario

Fecha límite de Registro de Información: 12/02/2018

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Compleitud	Cerrar Proyecto
2017003050028 - APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA	ABIERTO	26/01/2018 9:38:19 a. m.	2018 5-Mayo		0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	<input type="checkbox"/>

¿Cómo entender el tablero de control?

Indica si el proyecto se encuentra en ejecución y esta habilitado para registrar avance en las variables

Avance en las metas de los indicadores de producto (incluye registro cualitativo)

$\% \text{ Avance Físico de producto} = \text{Sumatoria de (Av. Vigencia del indicador de producto cadena de valor / Meta Vigente * Peso \% * 100)}$

Fecha límite de Registro de Información: 12/02/2018

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Compleitud	Cerrar Proyecto
2017003050028 - APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA	ABIERTO	26/01/2018 9:38:19 a. m.	2018 5-Mayo		0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	<input type="checkbox"/>

Mes habilitado para registrar seguimiento

Ejecución presupuestal por actividad (incluye registro cualitativo)

Ejecución presupuestal por proyecto (incluye Focalización)

$\% \text{ Avance Financiero} = (\text{Obligación / Apropriación Vigente}) * 100$

¿Cómo entender el tablero de control?

Última fecha en la que se viabilizó el proyecto "Registrado Actualizado"

Módulos de seguimiento que se deben registrar

Fecha límite de Registro de Información: 12/02/2018

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Complejidad	Cerrar Proyecto
2017003050028 - APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA	ABIERTO	26/01/2018 9:38:19 a. m.	2018 5-Mayo		0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión	<input type="checkbox"/>

Avance en las metas de los indicadores de gestión (incluye registro cualitativo)

$\% \text{ Avance Gestión} = \text{Sumatoria de (Avance Vigencia Indicador Gestión/ Meta Vigente} * \text{Peso \%} * 100)$

Opción para dar por terminado el proyecto una vez este ha cumplido su ejecución



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 4.1 Validación datos básicos



Rol
Responsable
Seguimiento

Seguimiento Territorio


Módulos de seguimiento
Rojo: sin registro – registro incompleto
Verde: reporte de seguimiento realizado

Entidad Usuario:
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Registrar Seguimiento

Registrar Seguimiento

Datos Básicos del Proyecto



Anexos



1. Imagen alusiva al proyecto, archivo en .jpg o .gif, tamaño máximo 21.000 Kb.

pendiente

[Imagen](#) [Carqar](#)

2017003050028 **APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA**
Entidad Territorial: ANTIOQUIA Entidad: ANTIOQUIA
Apropiacion Vigente 2018: \$250.000.000,00
Responsable: PAULA ANDREA MONTOYA MONROY-ANTIOQUIA
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPM):
Fecha Límite de Registro: 14/06/2018
Sin Resumen Ejecutivo

[Resumen Ejecutivo](#) [Carqar](#) [Resumen](#)

2. Documento elaborado para la observación pública del estado y de las perspectivas del proyecto de inversión. archivo .pdf, tamaño máximo 21.000 Kb.

Fecha: 2018 - Mayo
[Ficha EBI\(26/01/2018\)](#)

[Información General .. \(clic para expandir\)](#)

[Resumen Avances .. \(clic para expandir\)](#)

[Cadena de Valor .. \(clic para expandir\)](#)

3. Se visualiza y verifica información del proyecto: programa, subprograma presupuestal, objetivo general, descripción, (información registrada previamente en SUIFP)

1 Validar datos básicos del proyecto



Rol
Responsable
Seguimiento

6. Terminada la verificación de la información valide el módulo a través de este botón
Hecha la validación, el sistema pasará el botón de datos básicos de color rojo a verde.

Módulos de seguimiento
Rojo: sin registro – registro incompleto
Verde: reporte de seguimiento realizado

Entidad Usuario:
[Cerrar Sesión](#) [Cambiar Clave](#)

Registrar Seguimiento

Registrar Seguimiento

Consultar Seguimiento

Diagnóstico

Datos Básicos del Proyecto

1
Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos

4. El usuario observará la ejecución financiera histórica del proyecto, así como sus avances: físico, financiero y de gestión

2017003050028 APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA

2017 - 2020

Entidad Territorial: ANTIOQUIA Entidad: ANTIOQUIA

Apropiación Vigente 2018: \$250.000.000,00

Responsable: PAULA ANDREA MONTOYA MONROY-ANTIOQUIA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 26/01/2018 09:38:19 a. m.

Fecha Límite de Registro: 14/06/2018

Resumen Ejecutivo

Periodo: 2018 - Mayo

[Ficha EBI\(26/01/2018\)](#)

[Resumen Ejecutivo](#) [Cargar Resumen](#)

Información General .. (clic para expandir)

Resumen Avances .. (clic para expandir)

Cadena de Valor .. (clic para expandir)

5. Se encuentra la cadena de valor del proyecto (información registrada previamente en el SUIFP), para que sea verificada.



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 4.2 Ejecución presupuestal

2 Registrar ejecución presupuestal



Rol
Responsable
Seguimiento

Por Fuente de Financiación

Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia



Datos Básicos

2

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos



Ejecución Vigencia

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0305 - ANTIOQUIA - Propios	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	



Registra

Valor de los contratos o convenios legalmente suscritos

Valor por bienes o servicios recibidos a satisfacción, en el desarrollo de los contratos o convenios suscritos

Ejecución Vigencia

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Departamentos - 0305 - ANTIOQUIA - Propios	0,00	250000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Proyecto	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	

2 Registrar ejecución presupuestal



Rol
Responsable
Seguimiento

Focalización por Fuente de Financiación

Ejecución Presupuestal
del Proyecto-Vigencia



Datos Básicos

2

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos



Ejecución Vigencia

	Fuente	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago	
	Municipios - 86571 - PUERTO GUZMAN [PUTUMAYO] - SGP Ribereños	\$0,00	\$239.484.458,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	Regionalización Focalización
	Total Proyecto	\$0,00	\$239.484.458,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		



Registra

Este botón remite a la ventana para **focalizar los recursos** en las políticas asociadas al proyecto en el SUIFP (posconflicto, víctimas, grupos étnicos, entre otras)

Posconflicto Asignación Vigente: \$0,00

	Categoría	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
	1. Reforma Rural Integral - 1.4. Desarrollo social: EDUCACIÓN RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Distribuido	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 4.3 Ejecución física



Rol
Responsable
Seguimiento

Se debe desplegar el Objetivo y posteriormente el Producto para llegar al Indicador del Producto y registrar avance.

click

Indicadores de Producto

Datos Básicos Presupuestal **Productos** Actividades Gestión Anexos

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad para atender el proceso de desminado humanitario

PRODUCTO: Dotación de mobiliario .. (Click para expandir)

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% Peso 2018	Meta Total Proyecto 2017 - 2020	Avance Acumulado 2017	Meta Vigente 2018	Avance Vigencia 2018	Meta Rezagada 2017	Avance Rezago 2018	Regionalizable 2018	% Avance Vigencia 2018	% Avance Rezago 2018	Observación Mensual
	410106300 Planes de acción articulados	Número - Número: Cantidad	100	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00	0.00	

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad para atender el proceso de desminado humanitario

niños de educación y prevención

Documenta o justifica el avance alcanzado, bien sea inferior o superior a la meta establecida

Avance de la meta del indicador de producto a la fecha



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 4.4 Seguimiento actividades



Rol
Responsable
Seguimiento

Se debe desplegar el Objetivo y posteriormente el Producto para llegar a las actividades y registrar su valor obligado – avance cualitativo.

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto

Datos Básicos
 Presupuestal
 Productos
 Actividades
 Gestión
 Anexos

Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	\$0	\$250.000.000	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	\$0	\$0	\$0,00	\$0,00

click

Ejecución
 Cronológico

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad para atender el proceso de desminado humanitario [OBLIGADO = \$0]

PRODUCTO: Dotación de mobiliario ... (Click para expandir)

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Equipo estudio no técnico y despeje	\$100.000.000,00	\$101.000.000,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total Producto			\$0,00	\$0,00	

Registro cualitativo del avance de la actividad

Valor por bienes o servicios recibidos a satisfacción, en el desarrollo de los contratos o convenios suscritos



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Paso 4.5 Seguimiento de gestión

5 Registrar avance indicador de gestión



Rol
Responsable
Seguimiento

Indicadores de Gestión

✓

Datos Básicos | Presupuestal | Productos | Actividades | **Gestión** | Anexos

5

Buscar BIS

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso2018	Meta Vigente2018	Avance Vigencia2018	% Avance Vigencia2018	Observación Mensual
	9900G020 Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	Número- Número: Cantidad	100,	70,0000	0,0000	0,00	



Registra

Avance de la meta del indicador de gestión a la fecha

Peso porcentual del indicador

Documenta o justifica el avance alcanzado, bien sea inferior o superior a la meta establecida

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso2018	Meta Vigente2018	Avance Vigencia2018	% Avance Vigencia2018	Observación Mensual
	9900G020 Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	Número- Número: Cantidad	100	70,0000	0,0000	0,00	



Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Anexos

Incluir anexos



Rol
Responsable
Seguimiento



Ver Anexos

Datos Básicos

Presupuestal

Productos

Actividades

Gestión

Anexos



2017003050028 APOYO A LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN ANTIOQUIA 2017 - 2020

Entidad Territorial: ANTIOQUIA Entidad: ANTIOQUIA


Apropiacion Vigente 2018: \$250.000.000,00

Responsable: PAULA ANDREA MONTOYA MONROY-ANTIOQUIA

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 26/01/2018 09:38:19 a. m.

Fecha Límite de Registro: 14/06/2018

Sin Resumen Ejecutivo Periodo: 2018 - Mayo
[Ficha EBI\(26/01/2018\)](#)

Anexar Documento  (El tamaño de los anexos disponible para este periodo es: 50 Mb)

Seleccionar	Vigencia	Fecha	Descripción	Descarga	Tamaño
-------------	----------	-------	-------------	----------	--------

Pueden anexarse los documentos que se requieran en formato .pdf, .zip y .jpg. Recuerde describir en pocas palabras la información de avance contenida en el documento.

El máximo espacio que cuenta por periodo es de 21 Megabytes.



Departamento Nacional de Planeación
www.dnp.gov.co
